


**PROJEK GANTIAN PENUH 1 BD PRA
SEKOLAH DAN PEMBEKALAN PERALATAN
SERTA LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI
SK LASAU TINTAPON, KOTA BELUD,
SABAH.**

PEMBINAAN PRA SEKOLAH

Daerah : Kota Belud

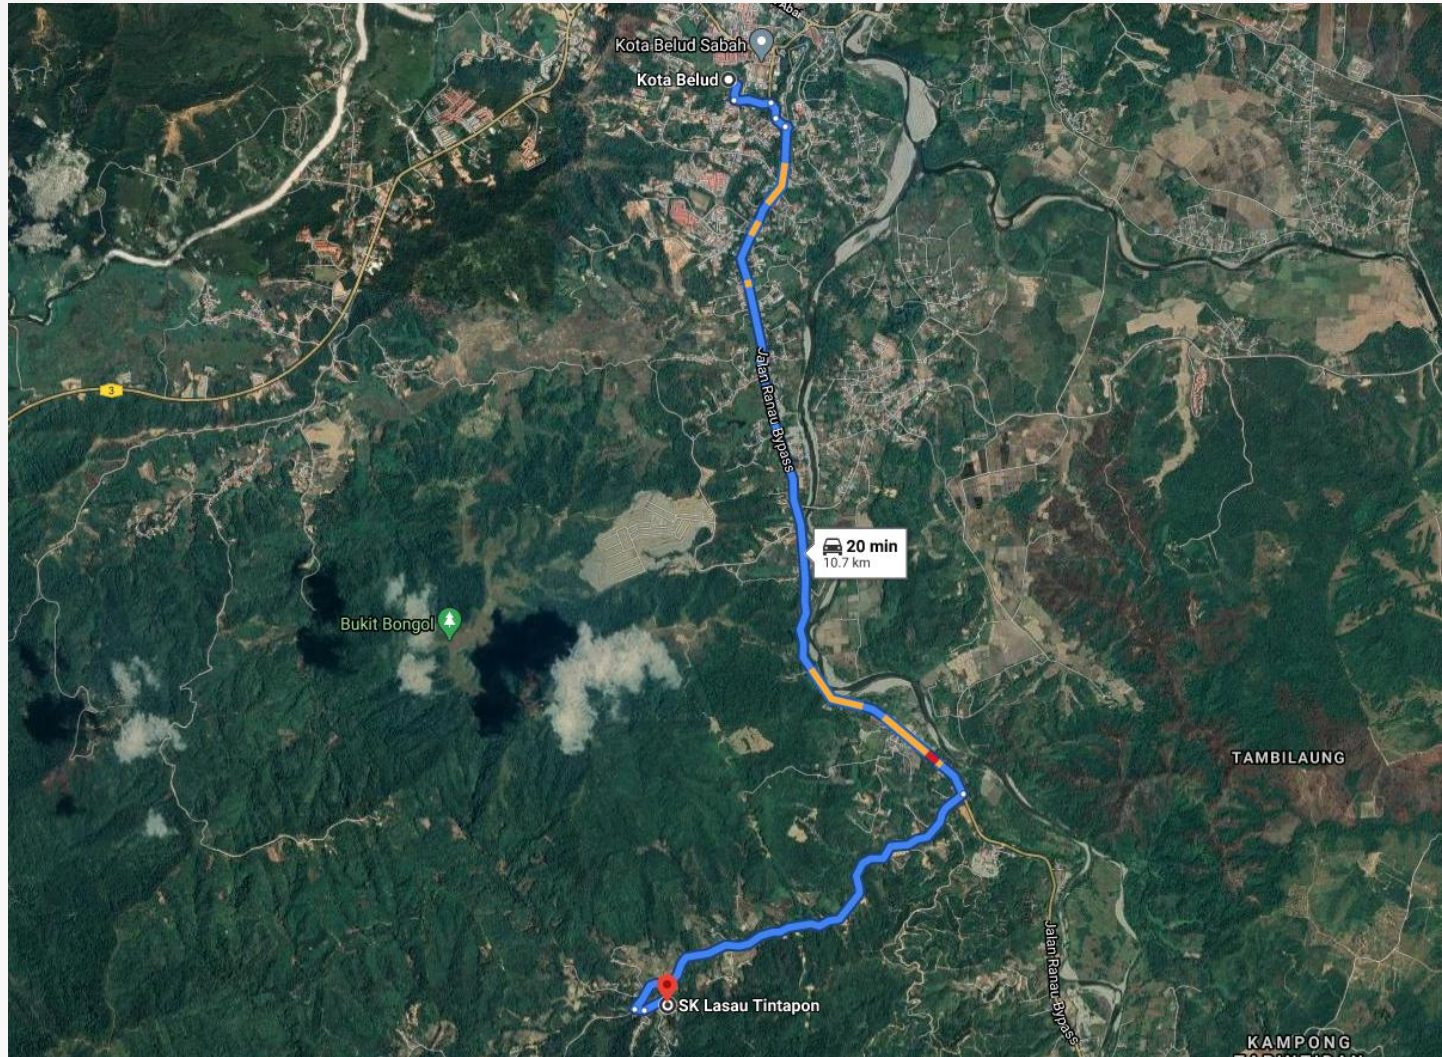

Kedudukan tapak ini terletak di Daerah Kota Belud, kira-kira 10.7 KM dari Pekan Kota Belud seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas.

SCOPE OF WORK

GENERAL WORK

1. Untuk membina dan menyiapkan satu (1) blok Pra Sekolah 1BD satu tingkat dengan kaedah IBS (konkrit pracetak), termasuk semua kemasinan yang ditentukan, kerja struktur dan kerja mekanikal dan elektrik, mengikut gambar dan spesifikasi yang diberikan oleh JKR Sabah;
2. Untuk membina dan menyiapkan *building foundation* jenis seperti yang ditentukan di bawah;
 - a. *Pad foundation* dengan *bearing capacity* 100kN / m² yang dibenarkan dapat dicapai pada kedalaman tidak kurang dari 1.5 meter dari permukaan tanah yang ada
3. Untuk membina dan menyiapkan *chainlink fencing* setinggi 1.8 meter sepanjang lebih kurang 58 meter seperti yang ditunjukkan dalam gambar dan spesifikasi;
4. Melaksanakan dan menyiapkan *cut and fill earthwork* dengan jumlah anggaran sekitar 810 m³, termasuk pemadatan dan pembersihan serpihan lain kepada kepuasan SO;
5. Untuk membina dan melengkapkan pintu masuk utama termasuk *sliding gate*, *side gate*, *brick facade* yang *rendered* dan dicat, dan barang-barang lain yang diperlukan sehingga ketinggian 1.8 meter seperti yang ditunjukkan dalam gambar dan terperinci dalam spesifikasi;
6. Untuk membina dan menyiapkan *interlocking brick path* dengan luas sekitar 6m² seperti yang ditunjukkan dalam gambar dan spesifikasi;
7. Untuk membina dan menyiapkan konkrit *hardstanding* setebal 250mm yang ditunjukkan sebagai 'dataran kejat' ke kawasan seluas sekurang-kurangnya 55.1 meter² mengikut gambar dan spesifikasi;
8. Untuk menyediakan, meletakkan dan menyiapkan *spot turfing* ke semua kawasan luar dalam batas pagar (tanpa *hardstanding*) ke kawasan seluas 400 meter²;
9. Untuk membina dan melengkapkan empat (4) unit *manhole* konkrit seperti yang ditunjukkan dalam gambar dan spesifikasi;

SCOPE OF WORK

GENERAL WORK

10. Untuk membekalkan dan memasang *proprietary* tangki HDPE Septic termasuk menguji dan pentauliahan sebagaimana yang dinyatakan dalam *Section F* di *General Specifications and Additional Clauses*;
11. Untuk membekalkan, memasang dan menyiapkan *half round precast perimeter drain* selebar 230mm dengan penutup longkang pracetak sehingga panjang lebih kurang 380 meter;
12. Melaksanakan dan menyiapkan perawatan anti-rayap sebagaimana ditentukan dalam *SECTION C, ITEM 3.0:Subterranean Termites*;
13. Untuk menyiapkan dan menyerahkan lukisan *as-built* setelah penyelesaian semua bangunan seperti yang diperincikan dalam *SECTION A, ITEM 45:As-built Drawings*;
14. Kerja-kerja lain seperti yang ditunjukkan dalam gambar dan spesifikasi.

SCOPE OF WORK

BUILDING WORK

1. SENARAI BANGUNAN YANG MEMERLUKAN LANTIKAN/KHIDMAT PEMBEKAL IBS


-MENGANDUNGI LUKISAN ARKITEK SAHAJA

1. Untuk membina dan menyiapkan satu (1) blok Pra Sekolah 1BD satu tingkat dengan kaedah IBS (konkrit pracetak), termasuk semua kemasinan yang ditentukan, kerja struktur dan kerja mekanikal dan elektrik, mengikut gambar dan spesifikasi yang diberikan oleh JKR Sabah;


PROVISIONAL SUM ITEMS

1. Pembekal perabot *loose furniture* untuk 1 blok Pra Sekolah 1BD yang akan dibeli di bawah CENTRAL CONTRACT SUPPLIER berdaftar.
2. Untuk membekalkan dan memasang taman permainan kanak-kanak luar yang modular.
3. Untuk membekalkan dan menyiapkan pendawaian elektrik *single-phase* dari sumber yang ada ke bangunan.
4. Melaksanakan dan menyiapkan kerja retikulasi air luaran.

PELAN KEDUDUKAN TAPAK SK LASAU TINTAPON, KOTA BELUD, SABAH (PRASEKOLAH)

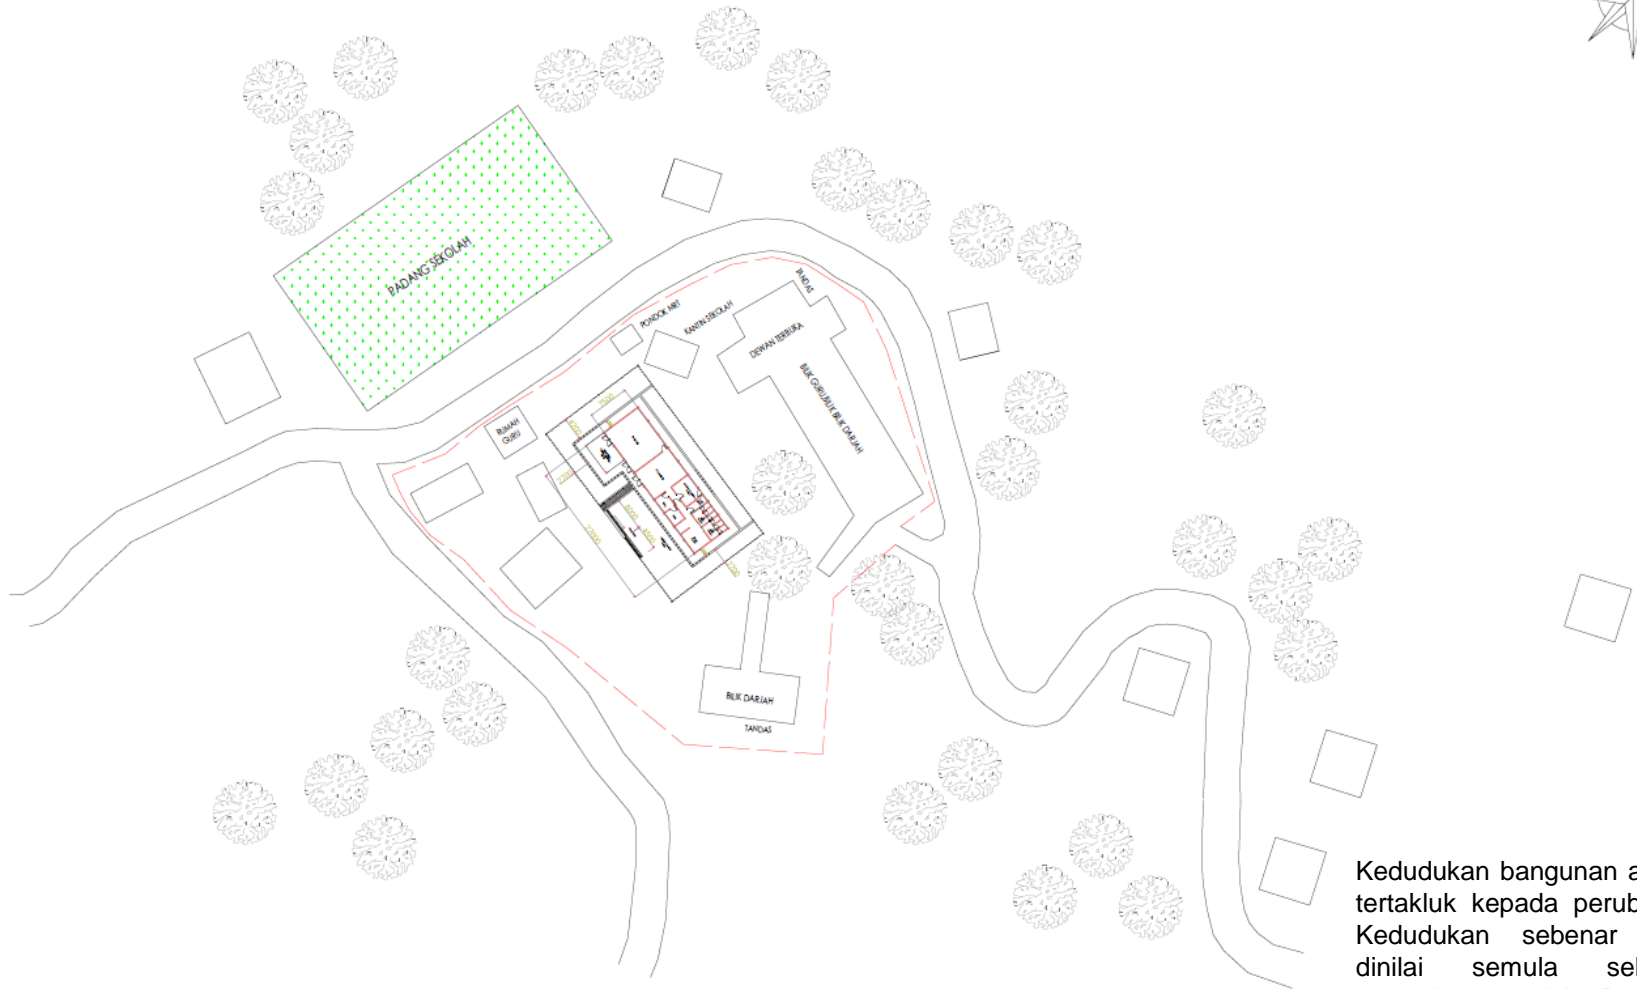

Kedudukan bangunan adalah tertakluk kepada perubahan. Kedudukan sebenar akan dinilai semula sebelum permulaan projek Bersama JKR dan pihak sekolah.

 CAWANGAN ARKITEK IBU PEJABAT JKR SABAH	PELANGGAN: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA	DILUKIS OLEH: MOHD AZLAN JUMATIN	UKURAN: N.T.S	PROJEK:	PERKARA:
	KPI/ARKITEK: AR. VICTOR CHONG	DISEMAK OLEH: ALEXANDER M.GODON	TARIH: MAC 2019	SITE LAYOUT SK LASAU TINTAPON, KOTA BELUD, SABAH (PRASEKOLAH)	PELAN TAPAK

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Jabatan Kerja Raya, Daerah Kota Belud

Tel. : 088 976444, 976553, 976554

Fax: 088 976777

